

CHECKLIST DE INSTALAÇÕES - REDE E CFTV - (STELECOM)

OBRA DT1B / GRADO ENGENHARIA

DESCRIÇÃO DO CHECKLIST TREMEDAL DT1B				FOI REALIZADO?		OBSERVAÇÃO
ITEM	SERVIÇO	TIPO	DATA	SIM	NÃO	
1	TOMADA ELETRICA NAO PREVISTA EM PROJETO PARA INSTALACAO DO RADIO NA SALA DE ATENDIMENTO (BASE FIXA)	RADIO	24/08/2026		X	
2	ELETRODUTO 1" PARA PASSAGEM DO CABO RF	RADIO	24/08/2026	X		
3	SUPORTE PARA MASTRO 1 1/4"	RADIO	24/08/2026	X		
4	MASTRO 1 1/4 DE 4 METROS INSTALADO NA COBERTURA	RADIO	24/08/2026	X		
5	REDE DE ENTRADA - COM PONTALETE E ELETRODUTO 1 1/2"	TELEFONIA	24/08/2026	X		
6	CAIXA DE DISTRIBUICAO TAMANHO MINIMO DE 40CMX40CM C/ FUNDO DE MADEIRA INSTALADA NA ALTURA PADRAO DE 1,20M	TELEFONIA	24/08/2026	X		
7	BLOCO DE DISTRIBUICAO COOK - M10	TELEFONIA	24/08/2026	X		
8	TUBULACAO DA ENTRADA SUBTERRANEA 1 1/2" COM CAIXA DE PASSAGEM	TELEFONIA	24/08/2026	X		
9	INSTALACAO DE PATCH PANEL CAT 5E NO RACK DA SALA TECNICA	TELEFONIA	24/08/2026	X		
10	CABO DE ENTRADA - CTP/APL CAT 5 DE 10 PARES DEVIDAMENTE INSTALADO E COM TESTE DE CONTINUIDADE REALIZADO ENTRE BLOCO M10 X PATCH PANEL CAT 5E	TELEFONIA	24/08/2026	X		
11	PONTO DE CONCENTRACAO DOS CABOS DE ENTRADA E DISTRIBUICAO NA SALA TECNICA DEVIDAMENTE CONECTADO, ANILHADO, IDENTIFICADO E ORGANIZADO COM VELCRO	TELEFONIA	24/08/2026	X		
12	REDE INTERNA PROJETADA COM CABOS UTP CAT 6 DEVIDAMENTE DISTRIBUIDOS	TELEFONIA	24/08/2026	X		

CHECKLIST DE INSTALAÇÕES - REDE E CFTV - (STELECOM)

OBRA DT1B / GRADO ENGENHARIA

CONTINUAÇÃO - DESCRIÇÃO DO CHECKLIST TREMEDAL DT1B

ITEM	SERVIÇO	TIPO	DATA	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
13	SALAS PREVISTAS EM PROJETO COM CONECTORES (MACHO E FEMEA) RJ45 CAT6 NOS PONTOS DE VOZ	TELEFONIA	24/08/2026	X		

1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PC DT 1B



Fotos: Ponto de camera interna e externa, conectadas, identificadas.






			
			
			
			
Fotos: Ponto de camera interna e externa, conectadas, identificadas.			






Foto: Hack sem identificação e insta

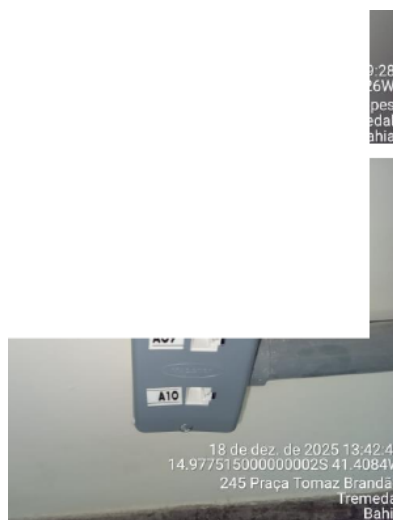

ão não foi concluída.



Tomadas instaladas e identificadas.

 segunda-feira, 24 de agosto de 2026 12:27:24 14.977516666666668S 41.40836333333334W Tremedal 45170-000 Brasil	 segunda-feira, 24 de agosto de 2026 12:27:10 14.977353333333333S 41.408505W Tremedal 45170-000 Brasil
  segunda-feira, 24 de agosto de 2026 12:26:29 14.97746S 41.40840166666667W Tremedal 45170-000	  segunda-feira, 24 de agosto de 2026 12:27:27 14.977533333333334S 41.40830333333336W Tremedal 45170-000 Brasil segunda-feira, 24 de agosto de 2026 12:23:19 14.977403333333333S 41.408449999999995W Tremedal 45170-000 Brasil
Tomadas instaladas e identificadas.	

 segunda-feira, 24 de agosto de 2026 12:28:25 14.977401666666667S 41.408401666666667W	 segunda-feira, 24 de agosto de 2026 12:16:50 14.977381666666668S 41.408378333333333W Tremedal 45170-000 Brasil
	
 segunda-feira, 24 de agosto de 2026 12:26:24 14.977443333333333S 41.408351666666667W segunda-feira, 24 de agosto de 2026 12:26:50 14.977419999999999S 41.408361666666664W Tremedal 45170-000 Brasil	 segunda-feira, 24 de agosto de 2026 12:28:20 14.977366666666667S 41.408416666666667W
Tomadas instaladas e identificadas.	



Tomadas instaladas e identificadas.



Foto: Caixa 40 x 40 com fundo de madeira, bloco de di

ibuição e identificação correta.



Foto: Mastro para antena de rádio

antena de rádio

Tomadas instaladas e identificadas.



Foto: Rack sem identificacao e instalacao nao foi concluida.



Foto: Caixa 40 x 40 com fundo de madeira, bloco de distribuicao e identificacao correta.



Foto: Mastro para antena de radio e antena de radio

DATA DA VISITA 24/08/2026
